Projektnummer: 2022-411

Eutin Neubau FW Bauzeitenplan

Pos	Vorgang	Daue	Start	Ende	Untern
1	**Tiefbau**	772kt	Do, 20.06.24	Fr, 31.07.26	
1.1	Prüfung Spundwandstatik durch Prüfstatiker	15at	Do, 20.06.24	Mi, 10.07.24	Kohr
2	Beauftragung Nachtrag	1at	Mi, 25.09.24	Mi, 25.09.24	
1.2	Antrag Schwerlasttransportgenehmigung	31at	Do, 26.09.24	Fr, 08.11.24	Kohr
1.3	Materialbeschaffung	31at	Do, 26.09.24	Fr, 08.11.24	Kohr
1.4	BE-Einrichtung und Baustraße	15at	Mo, 21.10.24	Fr, 08.11.24	
1.5	abschnittsweise Erdbau und Rammarbeiten	20at	Mo, 11.11.24	Fr, 06.12.24	Kohr
1.6	Ankerarbeiten, Gurtung, Anker spannen	22at	Mo, 09.12.24	Fr, 10.01.25	Kohr
1.7	Drainage	10at	Mo, 13.01.25	Fr, 24.01.25	Kohr
1.8	Baustart	1at	Mo, 11.11.24	Mo, 11.11.24	
1.9	früheste Beauftragung Tiefbau	1at	Di, 01.10.24	Di, 01.10.24	
1.10	Tiefbau: 1.BA, Aushub Torflinse und Auffüllungen, Unterbau Verkehrsflächen	86at	Mo, 27.01.25	Fr, 30.05.25	501
1.11	Geothermiebohrungen	39at	Mo, 19.05.25	Mo, 14.07.25	501
3	Rohbau	221a	Mo, 16.06.25	Fr, 24.04.26	
3.1	Rohbau BE	10at	Mo, 16.06.25	Fr, 27.06.25	301
3.2	Erw.Rohbau Gründung	35at	Mo, 30.06.25	Fr, 15.08.25	301
3.3	Rohbau Wände EG	49at	Mo, 18.08.25	Fr, 24.10.25	301
3.4	Rohbau Stb-Decken	20at	Mo, 27.10.25	Fr, 21.11.25	301
3.5	Rohbau Wände OG	20at	Mo, 24.11.25	Fr, 19.12.25	301
3.6	Rohbau Stb-Decken über OG	15at	Mo, 22.12.25	Mo, 12.01.26	301
3.7	Rohbau Verblendmauerwerk	39at	Mo, 22.12.25	Fr, 13.02.26	301
3.8	Erw. Rohbau Putzarbeiten	23at	Mo, 23.03.26	Fr, 24.04.26	301
3.9	Stb-Arbeiten und Rüstung Übungswand	20at	Mo, 16.02.26	Fr, 13.03.26	301
3.10	Erw. Rohbau Gerüstbauarb.	148a	Mo, 25.08.25	Fr, 20.03.26	301
4	Hüllgewerke	139a	Mo, 24.11.25	Fr, 12.06.26	
4.1	Holzbau Zimmerer Abnetzen und Montage Dachbinder	9at	Mo, 22.12.25	Fr, 02.01.26	302
4.2	Holzbau Montage Trapezblech	15at	Mo, 05.01.26	Fr, 23.01.26	302
4.3	Dachdecker Notabdichtung ü.EG	10at	Mo, 24.11.25	Fr, 05.12.25	303
4.4	Dachdecker Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung ü.OG	20at	Mo, 26.01.26	Fr, 20.02.26	303
4.5	Dachdecker Gründach OG	14at	Di, 07.04.26	Fr, 24.04.26	303
4.6	Dachdecker Dampfsperre Dämmung und Abdichtung Decke ü.EG	22at	Mo, 27.04.26	Fr, 29.05.26	303
4.7	Dachdecker Gründach EG Dachterrasse	10at	Mo, 01.06.26	Fr, 12.06.26	303
4.8	Metallbau-Fassade + Sektionaltore	27at	Mo, 05.01.26	Di, 10.02.26	304
4.9	Metallbau Montage UK Fassade EG-OG	20at	Mo, 05.01.26	Fr, 30.01.26	304
4.10	Metallbau Montage UK Fassade OG	9at	Mo, 22.12.25	Fr, 02.01.26	304
4.11	Metallbau Montage Dämmung + Fassade OG	5at	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26	304
4.12	Metallbau Montage Dämmung + Fassade	20at	Mo, 30.03.26	Di, 28.04.26	304
4.13	Fenster- und Außentüren Abstimmung und Freigabe	5at	Mo, 24.11.25	Fr, 28.11.25	305
4.14	Montage Fenster- und Außentüren	20at	Mo, 23.02.26	Fr, 20.03.26	305
4.15	Bau dicht	1at	Mo, 23.03.26	Mo, 23.03.26	
4.16	Stahlbau Herstellung und Übergabe Stahlträger für Turm	5at	Mo, 02.02.26	Fr, 06.02.26	318
4.17	Stahlbau Montage Fluchttreppe	10at	Mo, 23.03.26	Di, 07.04.26	318
5	Ausbaugewerke	264a	Mo, 08.12.25	Fr, 18.12.26	
5.1	Trockenbau UK Vorwände	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26	306
5.2	Trockenbau Wände schließen	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26	306
5.3	Trockenbau UK Decken	10at	Mo, 11.05.26	Di, 26.05.26	306
5.4	Trockenbau Einbau AHD	20at	Mo, 17.08.26	Fr, 11.09.26	306
5.5	Estrich Vorarbeiten	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26	307
5.6	Estrich einbringung + Aushärtung (Beschleuniger)	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26	307
5.7	Verbundabdichtung	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26	308
5.8	Wand-Fliesen	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26	308
5.9	Boden-Fliesen	20at	Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26	308
5.10	Bodenbeläge	20at	Mo, 12.10.26	Fr, 06.11.26	309
5.11	Innentüren Abstimmung und Freigabe	1at	Mo, 08.12.25	Mo, 08.12.25	310/312
5.12	Tischler Innentüren Stahlzargen	15at	Mo, 02.03.26	Fr, 20.03.26	310/312
5.13	Tischler Innentüren Türblätter montieren	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	310/312
5.14	Tischler Trennwände Abstimmung und Freigabe	5at	Mo, 02.02.26	Fr, 06.02.26	311
5.15	Tischler Trennwände Montage HSW-Schiene	5at	Mo, 11.05.26	Mo, 18.05.26	311
5.16	Tischler Trennwände Montage HSW WC-TW	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	311
5.17	Schlosser Montagen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	313
5.18	Maler	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	314
5.19	Rütteboden, Einbringung incl Sperrung	30at	Mo, 24.08.26	Fr, 02.10.26	315
5.20	Bauendreinigung	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26	316
5.21	Schließanlage	4at	Mo, 26.10.26	Do, 29.10.26	317
6	Technische Gewerke	350a	Mo, 30.06.25	Di, 10.11.26	
6.1	Sanitärinstallation Rohmontage / Trassen	36at	Mo, 23.03.26	Fr, 15.05.26	401
6.2	Sanitärinstallation [FW] Vorinstallation	28at	Mo, 11.05.26	Fr, 19.06.26	401
6.3	Sanitärinstallation [FW] Endmontage	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26	401
6.4	Heizungsinstallation [FW] Rohmontage Trassen	32at	Mo, 23.03.26	Fr, 08.05.26	402
6.5	Heizung Techn.Einbauten HA-Raum EG	23at	Mo, 11.05.26	Fr, 12.06.26	402
6.6	Heizleitung Estrich	15at	Mo, 13.07.26	Fr, 31.07.26	402
6.7	Belegreif heizen	15at	Mo, 17.08.26	Fr, 04.09.26	402
6.8	Heizungsinstallation [FW] Deckenstrahlplatten	23at	Mo, 23.03.26	Fr, 24.04.26	402
6.9	Lüftungsinstallation [FW] Anlage Technikr. OG	10at	Mo, 16.02.26	Fr, 27.02.26	403
6.10	Lüftungsinstallation [FW] Leitungen	32at	Mo, 23.03.26	Fr, 08.05.26	403
6.11	Lüftung Inbetriebnahme	20at	Mo, 13.07.26	Fr, 07.08.26	403
6.12	Elektroinstallation [FW] Trassen Rohmontage	15at	Mo, 23.03.26	Di, 14.04.26	404
6.13	Elektroinstallation [FW]	2at	Mo, 23.03.26	Di, 24.03.26	404
6.14	Blitzschutzanlage Erdungsanlage	10at	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25	405
6.15	Blitzschutzanlage Ableitungen	5at	Mo, 22.12.25	Fr, 26.12.25	405
6.16	Blitzschutzanlage Dach	5at	Mo, 23.02.26	Fr, 27.02.26	405
6.17	PV UK FW	10at	Mo, 16.03.26	Fr, 27.03.26	406
6.18	PV Anlage [Feuerwehr] Paneele	23at	Mo, 13.04.26	Fr, 15.05.26	406
6.19	Aufzugsanlagen vorab Übergabe	5at	Mo, 18.08.25	Fr, 22.08.25	407
6.20	Aufzugsanlagen Montage Maschinen und Kabine	15at	Mo, 17.08.26	Fr, 04.09.26	407
6.21	Fachausstattung Atemschutzwerkstatt	2at	Mo, 09.11.26	Di, 10.11.26	408
6.22	Abgasabsaugung	23at	Mo, 23.03.26	Fr, 24.04.26	409
6.23	Gebäudeautomation [Feuerwehr] Verkabelung	20at	Mo, 27.04.26	Mi, 27.05.26	410
6.24	GA Schaltschrank Feldgeräte	25at	Di, 12.05.26	Mi, 17.06.26	410
6.25	GA Inbetriebnahme	35at	Do, 23.07.26	Mi, 09.09.26	410
6.26	Wärmeerzeugung [Container SWE]	20at	Mo, 20.07.26	Fr, 14.08.26	413
6.27	PV Anlage UK [SWE]	9at	Mo, 23.03.26	Do, 02.04.26	414
6.28	PV Anlage Montage Paneele [SWE]	20at	Mo, 30.03.26	Di, 28.04.26	414
6.29	Fachausstattung Funkraum	2at	Mo, 09.11.26	Di, 10.11.26	415
6.30	Prüfsachverständige Schlussprüfung	2at	Mo, 10.08.26	Di, 11.08.26	411
6.31	Einregulierung Haustechnik	30at	Do, 10.09.26	Mi, 21.10.26	
1.12	Tiefbau 2.BA, Rückbau Baustraßen, Verkehrsflächen und Außenanlagen	90at	Mo, 23.03.26	Fr, 31.07.26	
1.13	Erstellung Planstraße "A"	90at	Mo, 23.03.26	Fr, 31.07.26	
5.22	Abnahmen und Mängelbeseitigung	30at	Mo, 09.11.26	Fr, 18.12.26	
7	Übergabe	2at	Mo, 21.12.26	Di, 22.12.26	

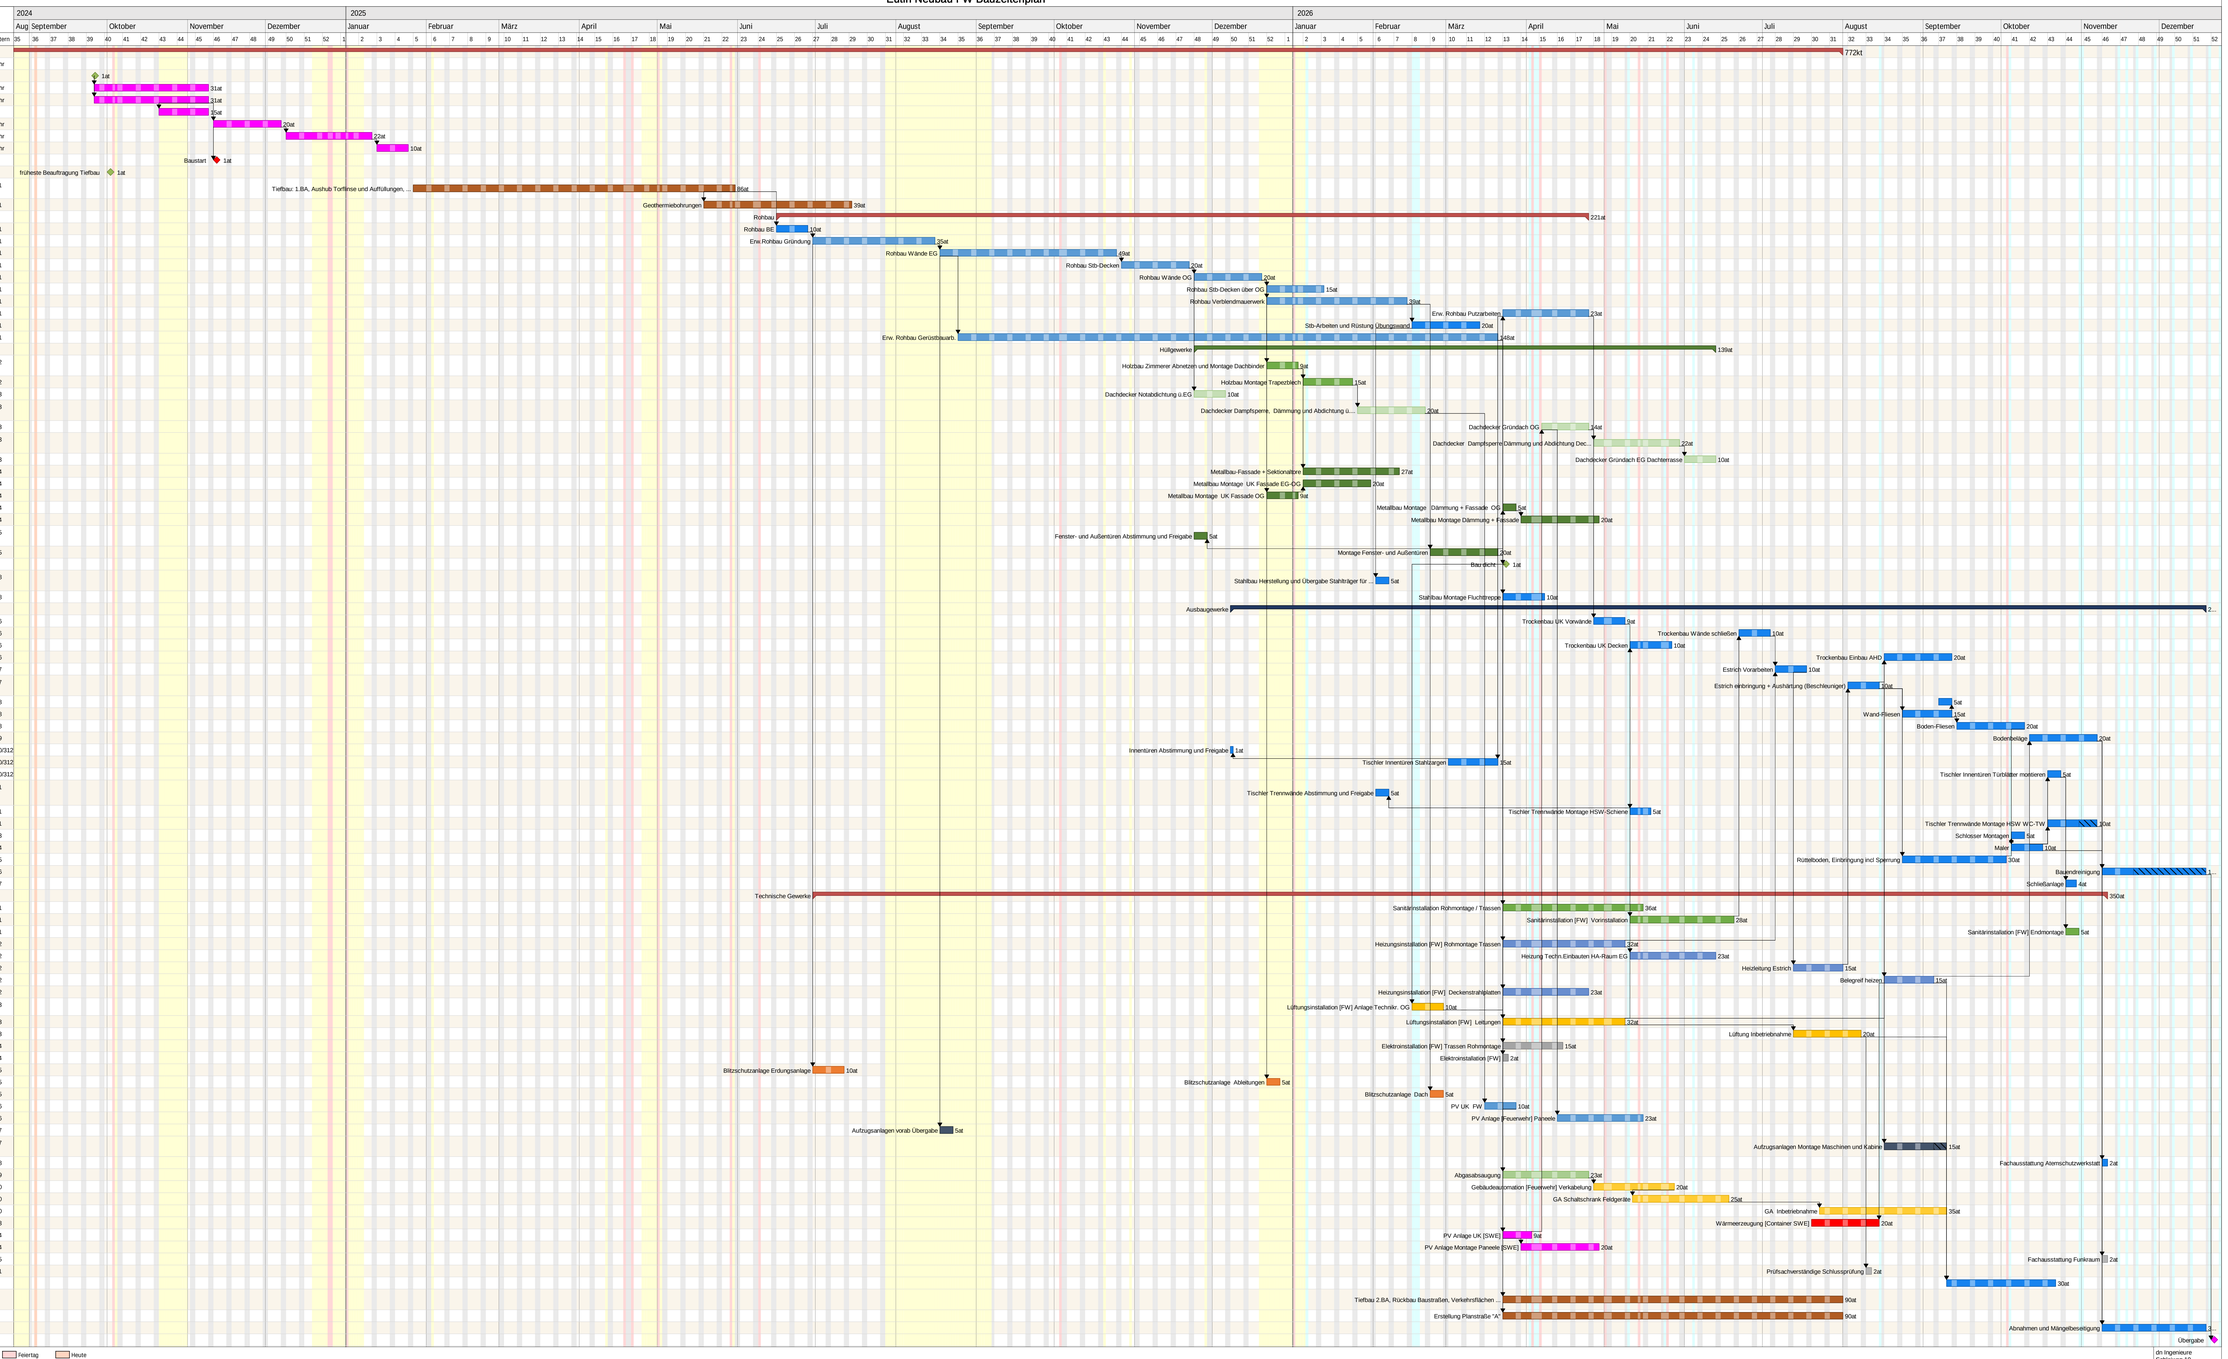

Projektzeitrahmen von Mo, 17.06.24 bis Do, 31.12.26
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
Druckdatum: 03.09.2024 16:57
Filter:
Bearbeiter: Gundelach

Feiertag
Infotag
Schulferien
Heute

dn Ingenieure
Schleiweg 10
D-24118 Kiel
Tel. +49 431 59674622
Fax +49 431 59674699
